

PROJEKTNI PLAN I RASPORED LJUDSKIH RESURSA

Projekt: Razvoj i implementacija informacijskog sustava

Vremenski okvir: 12. travnja – 6. rujna 2026.

Verzija: 1.0

Datum izrade: 17. lipnja 2026.

1. VREMENSKI RASPORED PROJEKTA (12.4. – 6.9.2026.)

U nastavku je prikazan detaljan hodogram projekta podijeljen u šest ključnih faza. Svaka faza sadrži definirane korake, trajanje, međusobne ovisnosti te pripadajuću prekretnicu (milestone).

Faza 1: Pokretanje projekta (12.4. – 18.4.2026.)

Korak	Naziv aktivnosti	Trajanje	Zavisnost	Prekretnica (Milestone)
1.1	Definiranje projektnog tima	2 dana	--	
1.2	Izrada projektne povelje	3 dana	1.1	
1.3	Početni sastanak s dionicima (Kick-off)	2 dana	1.2	Projekt pokrenut (18.4.)

Faza 2: Analiza zahtjeva (19.4. – 16.5.2026.)

Korak	Naziv	Trajanje	Zavisnost	Prekretnica
-------	-------	----------	-----------	-------------

	aktivnosti			(Milestone)
2.1	Intervjuiranje dionika	5 dana	1.3	
2.2	Specifikacija poslovnih zahtjeva	5 dana	2.1	
2.3	Specifikacija korisničkih zahtjeva	5 dana	2.2	
2.4	Specifikacija nefunkcionalni h zahtjeva	4 dana	2.3	Specifikacija odobrena (16.5.)

Faza 3: Dizajn (17.5. – 20.6.2026.)

Korak	Naziv aktivnosti	Trajanje	Zavisnost	Prekretnica (Milestone)
3.1	Konceptualni model podataka	5 dana	2.4	
3.2	Logički model podataka	5 dana	3.1	
3.3	Dijagram klasa (UML)	5 dana	3.2	
3.4	Dijagram aktivnosti i use case	5 dana	3.3	
3.5	Arhitektura sustava (deployment)	5 dana	3.4	Dizajn završen (20.6.)

Faza 4: Implementacija (21.6. – 16.8.2026.)

Korak	Naziv aktivnosti	Trajanje	Zavisnost	Prekretnica (Milestone)
4.1	Modul za upravljanje donacijama	12 dana	3.5	
4.2	Modul za upravljanje volonterima	10 dana	4.1 (paralelno)	
4.3	Modul za inteligentno spajanje	10 dana	4.2	
4.4	Modul za obavještanje (email/SMS)	8 dana	4.3	
4.5	Revizijski trag (audit log)	7 dana	4.4	
4.6	Generiranje izvještaja (PDF)	7 dana	4.5	Implementacija završena (16.8.)

Faza 5: Testiranje (17.8. – 30.8.2026.)

Korak	Naziv aktivnosti	Trajanje	Zavisnost	Prekretnica (Milestone)
5.1	Unit testiranje	4 dana	4.6	
5.2	Integracijsko testiranje	4 dana	5.1	
5.3	Korisničko	6 dana	5.2	Testiranje

	prihvaćanje (UAT)			završeno (30.8.)
--	-------------------	--	--	-------------------------

Faza 6: Deployment (31.8. – 6.9.2026.)

Korak	Naziv aktivnosti	Trajanje	Zavisnost	Prekretnica (Milestone)
6.1	Postavljanje na produkcijski server	2 dana	5.3	
6.2	Migracija baze podataka	2 dana	6.1	
6.3	Edukacija korisnika	2 dana	6.2	PUŠTANJE U PRODUKCIJU (6.9.)

2. PREKRETNICE (MILESTONES)



Prekretnice predstavljaju ključne kontrolne točke na projektu koje označavaju završetak važne faze ili isporuku kritičnog rezultata.

Oznaka	Prekretnica	Datum	Opis i uvjeti ispunjenja
M1	Projekt pokrenut	18.4.2026.	Tim je službeno formiran, a Projektna povelja je odobrena od strane sponzora.
M2	Specifikacija odobrena	16.5.2026.	Svi poslovni, korisnički i nefunkcionalni zahtjevi su

			definirani, dokumentirani i potpisani od strane dionika.
M3	Dizajn završen	20.6.2026.	Modeli podataka (konceptualni i logički), UML dijagrami te arhitektura sustava su finalizirani.
M4	Implementacija završena	16.8.2026.	Svi programski moduli su u potpunosti razvijeni i spremni za integraciju.
M5	Testiranje završeno	30.8.2026.	Svi testni scenariji su izvršeni, greške otklonjene, a Korisničko prihvatanje (UAT) je službeno odobreno.
M6	Puštanje u produkciju	6.9.2026.	Sustav je postavljen na produkciju, baza podataka je migrirana, a edukacija korisnika je uspješno dovršena.

3. GANTTOGRAM (GanttProject XML / Vizualni prikaz)

Upute za uvoz Ganttograma: > Za vizualizaciju ovog rasporeda unutar vašeg Word dokumenta, uvezite prethodno generiranu XML datoteku u program **GanttProject**, izvezite je kao sliku (PNG ili JPG) te je umetnite u prostor ispod.

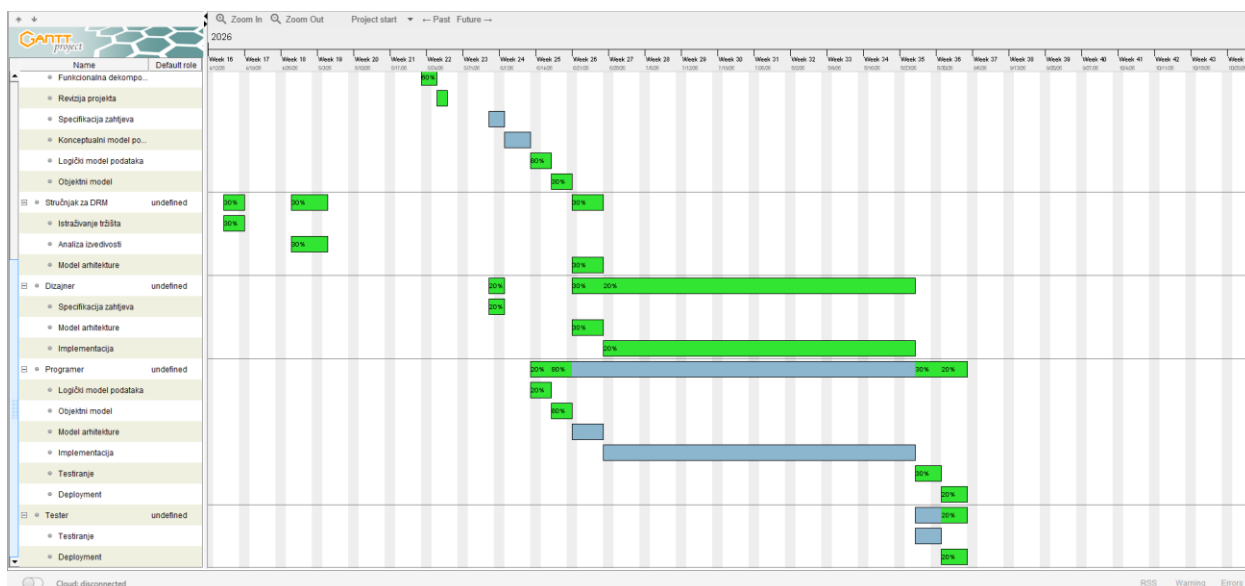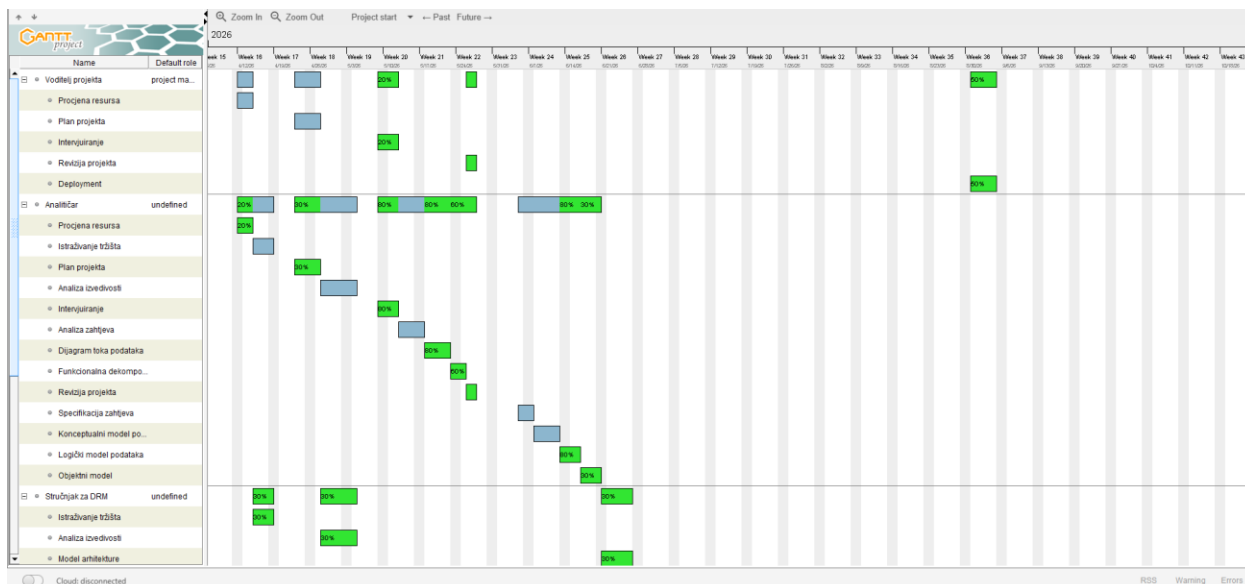

4. SAŽETAK ANGAŽMANA LJUDSKIH RESURSA (POSTOTCI)

Raspodjela resursa optimizirana je prema novoj konsolidiranoj strukturi uloga kako bi se osigurala maksimalna učinkovitost i jasnoća u raspodjeli zadataka.

Uloga	Broj	Prosječni angažman	Napomena i dinamika angažmana

Voditelj projekta	1	~45%	Najveći angažman na samom početku (100% u Fazi 1) i na kraju projekta (100% u Fazi 6). Tijekom faza razvoja i testiranja angažman iznosi 20-30%.
Analitičar	2	~70%	Objedinjuje poslovnu i sistemsku analizu. Maksimalan angažman u fazi analize (100%) i dizajna (50-100% za izradu modela podataka i UML dijagrama), uz podršku tijekom implementacije.
Dizajner	0.5	~20%	Angažiran isključivo tijekom faze dizajna (30% u Fazi 3) za potrebe izrade korisničkog sučelja (UI/UX) i prototipa.
Programer	3	~77%	Objedinjuje backend i frontend tim (ukupno 3 programera). Konstantno visok angažman (60-100%) u cjelokupnoj fazi implementacije (Faza 4) za razvoj

			modula i integraciju sustava.
Tester	1	~80%	Maksimalno angažiran tijekom faze testiranja (100% u Fazi 5) za izvršavanje testnih scenarija te pruža podršku prilikom deploymenta i edukacije korisnika (50% u Fazi 6).
Stručnjak za DRM	1	~40%	Odgovoran za Deployment, Release & Migration (baze podataka i serveri). Najveći angažman u završnoj fazi (50-100% u Fazi 6) te povremena podrška pri postavljanju razvojne i testne okoline (20%).

Kraj dokumenta.
